

07.03.2019

**KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ' NE**

**Konu: Beton karot numunelerinin yerinde alınması hk.
İlgili: 68246331-310.99-E.149439 sayılı yazınız hk.**


İstanbul İli, KADIKÖY İlçesi, CAFERAĞA MH. ŞAKİRPAŞA SK. NO:20 KADIKÖY, 29 Pafta, 1018 Ada, 113 Parsel (**HALİDUN BUĞRA YARDIMCI – 1545537**) sayılı yere ait inşaatın bakanlık onaylı laboratuvarın test sonuçlarına göre 1.NORMLA KAT KOLON TAVAN betonu numuneleri istenilen standartlardan düşük çıktığı için belediyeniz gözetiminde ilgili yerden 14.02.2019 tarihinde karot alınmış ve 18.02.2019 tarihinde kırım yapılmıştır.

Söz konusu kırım sonuçları ekte olup, beton proje sınıfını karşıladığından imalatın devam etmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

**İLKE YAPI DENETİM A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Mimar Selahattin KAYAMAN**



Adres :

Sarayardı Cad. Toprak İş Merkezi
No:104 K:1 Hasa...
Kadıköy / İSTANBUL
Tel : (216) 349 12 19
Faks: (216) 349 69 97

Numune Bilgileri :

Rapor No : KR141
Rapor Tarihi : 18.02.2019

Yapı Sahibi : HALDUN BUĞRA VE HISS. (GÖKÖZ İNŞ.)
İnşaat Adresi : KADIKÖY Referans 1 :
Ada / Pafta / Parsel : 92/1018/113 Referans 2 :
Numune Çapı : 70X140 Beton Cinsi : C35/45
Test Standardı : Hazır Beton : İSMAIL DEMİRTAŞ BETON
Kull. Yer : 1.NORMAL KAT KOLON TAVAN (S104/S103/K118)


Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık gr.	Birim Ağırlık kg/dm ³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Kesme Dayanımı N/mm ²	Beton Sıcaklığı °C	Transmikser_no No
1	38.500	538.780	1354.00	2.510		15.02.19	18.02.19	136.890	35.556		
2	38.500	538.780	1341.00	2.490		15.02.19	18.02.19	145.430	37.774		
3	38.500	538.780	1362.00	2.530		15.02.19	18.02.19	167.150	43.416		K1221

Ortalama : 149.823 38.915

Deney Grafiği

Basınç Dayanımı (N/mm²)

Kırılma Yüğü (kN)

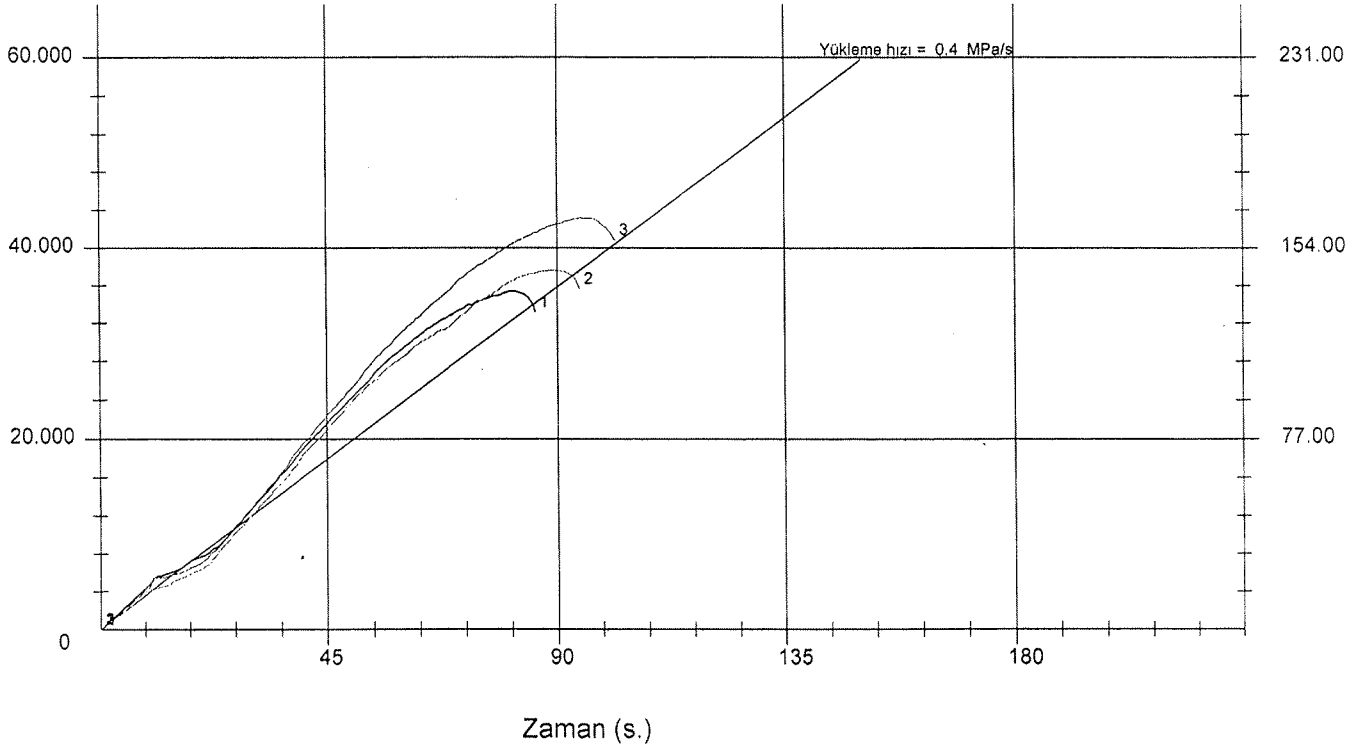

Açıklamalar:

İnşaat Teknikeri
M.Mustafa
MUK
