

Numune Bilgileri :

Rapor No : B5095-17
Rapor Tarihi : 18.12.2017

Yapı Sahibi : BİRSEN GÜVEN VE HİSS.

İnşaat Adresi : CAFERAĞA MH. YAVARBAY SK.NO:15 KADIKÖY

Boyut :

Yapı Denetim : İLKE YAPI DENETİM A.Ş

Pafta / Ada / Parsel : 34/1116/2

Katkı :

Beton Cinsi : C30

Test Standardı :

Hazır Beton : BOĞAZIÇI BETON

Kull. Yer : 3.NORMAL KAT KOLON PERDE TABLİYE


Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık gr.	Birim Ağırlık kg/dm ³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Basınç Dayanımı N/mm ²	Beton Sıcaklığı 'C	Transmikser_no No
1	225.00	3375.00	8094.00	2.40	28	20/11/17	18/12/17	984.86	43.77		
2	225.00	3375.00	8097.00	2.40	28	20/11/17	18/12/17	1002.00	44.53		
3	225.00	3375.00	8090.00	2.40	28	20/11/17	18/12/17	917.50	40.78		
4	225.00	3375.00	8097.00	2.40	28	20/11/17	18/12/17	1031.51	45.84		
5	225.00	3375.00	8090.00	2.40	28	20/11/17	18/12/17	982.69	43.68		
6	225.00	3375.00	8097.00	2.40	28	20/11/17	18/12/17	913.79	40.61		

Ortalama : 972.06 43.20

Deney Grafiği

Basınç Dayanımı (N/mm²)

Kırılma Yüğü (kN)

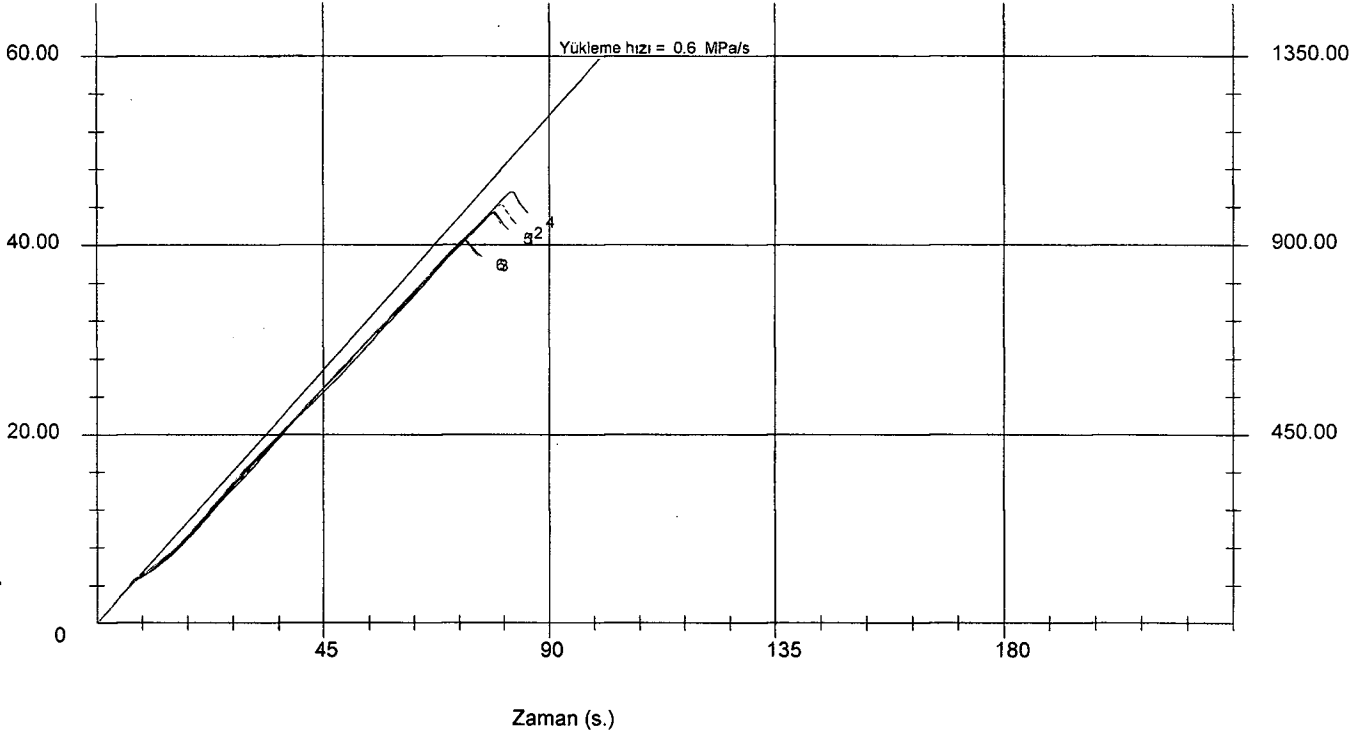

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan

E. Sarigül

E.SARIGÜL İNŞ.TEKNIKERİ

Onaylayan

Murat Kabadayı
Laboratuvar Denetçi Müh.
Denetçi Belge No:12381

Kayıt yeri : C:\Users\Win 7\Desktop\BETON17\5095-281.tst

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

7
