

KADIKÖY

BELEDİYESİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
BETON VE ZEMİN LABORATUARI
BETON BASINÇ DAYANIM TEST RAPORU
(EN 12390-3)

Bölüm No
DökümanNo
Yür. Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No

Yapı Sahibi / Proje Adı	MUAMMER KOÇ VE HİSS.		
Müteahhit Firma	GÖKÖZ YAPI		
Yapı Adresi	OSMANAĞA MAH.MAYIS GÜLÜ SOK.		
Parsel / Ada / Pafta	77	1429	8
Num.Alan.Tek.	SAVAŞ KURŞUN		
İrsaliye No	766648-766649-667-687		



NUMUNE BİLGİLERİ

Alındığı Tarih	22.10.2015	Numunenin Ait Olduğu Yapı	TEMEL BETONU
Lab Geliş Tarihi	23.10.2015		
Numune Adedi	12	Çökme (Slump) mm	16-15
Beton Sınıfı	C35 (PROJEC30)	Ortam Sıcaklığı	----
Numunenin Tipi	KÜP	Beton Sıcaklığı	----
Dökülen Beton Miktarı	150 m3	Alınış Saati	09:00/15:40
Beton Firması	DETAŞ BETON	Numunenin Bakım Tarzı	KÜRLEME

YAPILAN DENEY SONUÇLARI

7 GÜNLÜK						28 GÜNLÜK					
Deney Tarihi		29.10.2015				Deney Tarihi		19.11.2015			
Rapor Tarihi						Rapor Tarihi					
Sayfa No						Sayfa No					
Rapor No						Rapor No					
No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3	No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3	No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3	No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3
1	29.8	2.396	7			1	34.7	2.378	7	33.4	2.379
2	27.7	2.401	8			2	35.2	2.386	8	30.4	2.396
3	30.9	2.401	9			3	34.3	2.378	9		
4	26.6	2.366	10			4	33.1	2.378	10		
5			11			5	38.9	2.379	11		
6			12			6	36.9	2.377	12		
ORT		28.7				ORT		34.6			

Yükleme Hızı : 0.6 MPa/sn.

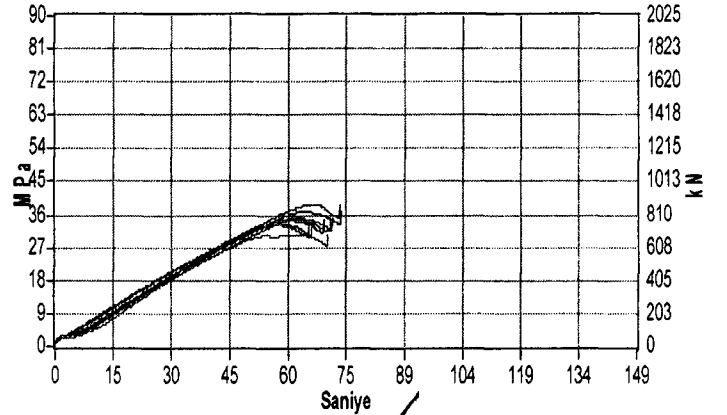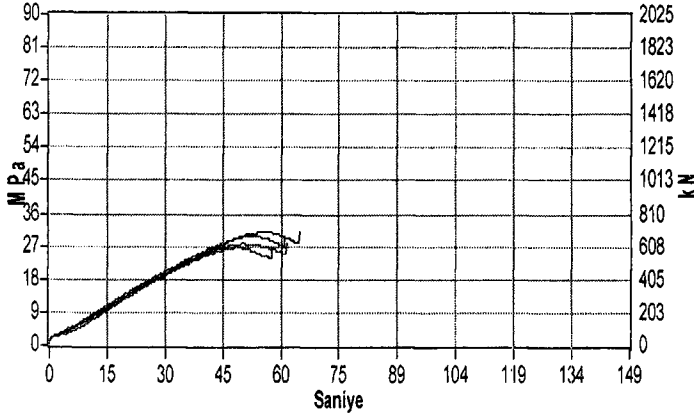

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
